Inicjowanie projektu

Projektowanie i wdrażanie sytemów informatycznych

Łukasz Szenkiel

COLLEGIUM WITELONA
Uczelnia Państwowa

1

Wstęp: Czym jest inicjacja projektu?

Etymologia słowa

inicjować

powodować zaczęcie się czegoś, co potem rozwija się dalej

lukasz@szenkiel-ubuntu: ~/Pulpit/inicjowanie

```
lukasz@szenkiel-ubuntu:~/Pulpit/inicjowanie$ git init
Zainicjowano puste repozytorium Gita w /home/lukasz/Pulpit/inicjowanie/.git/
lukasz@szenkiel-ubuntu:~/Pulpit/inicjowanie$
```

Definicja i cel inicjacji

- Inicjacja to oficjalne rozpoczęcie projektu, będące odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę biznesową.

Definicja i cel inicjacji

- Inicjacja to oficjalne rozpoczęcie projektu, będące odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę biznesową.
- Jest to fundament, na którym opiera się cały proces; tylko zrozumienie sensu inicjacji pozwala na sukces.

Definicja i cel inicjacji

- Inicjacja to oficjalne rozpoczęcie projektu, będące odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę biznesową.
- Jest to fundament, na którym opiera się cały proces; tylko zrozumienie sensu inicjacji pozwala na sukces.
- Głównym celem tego etapu jest odpowiedź na pytanie: *Co chcemy uzyskać?*

Definicja i cel inicjacji

- Inicjacja to oficjalne rozpoczęcie projektu, będące odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę biznesową.
- Jest to fundament, na którym opiera się cały proces; tylko zrozumienie sensu inicjacji pozwala na sukces.
- Głównym celem tego etapu jest odpowiedź na pytanie: *Co chcemy uzyskać?*
- Inicjacja pozwala ustalić, czy projekt jest wykonalny i wart realizacji.

2

Miejsce inicjacji w cyklu życia projektu

Cykl życia projektu wg PMBOK

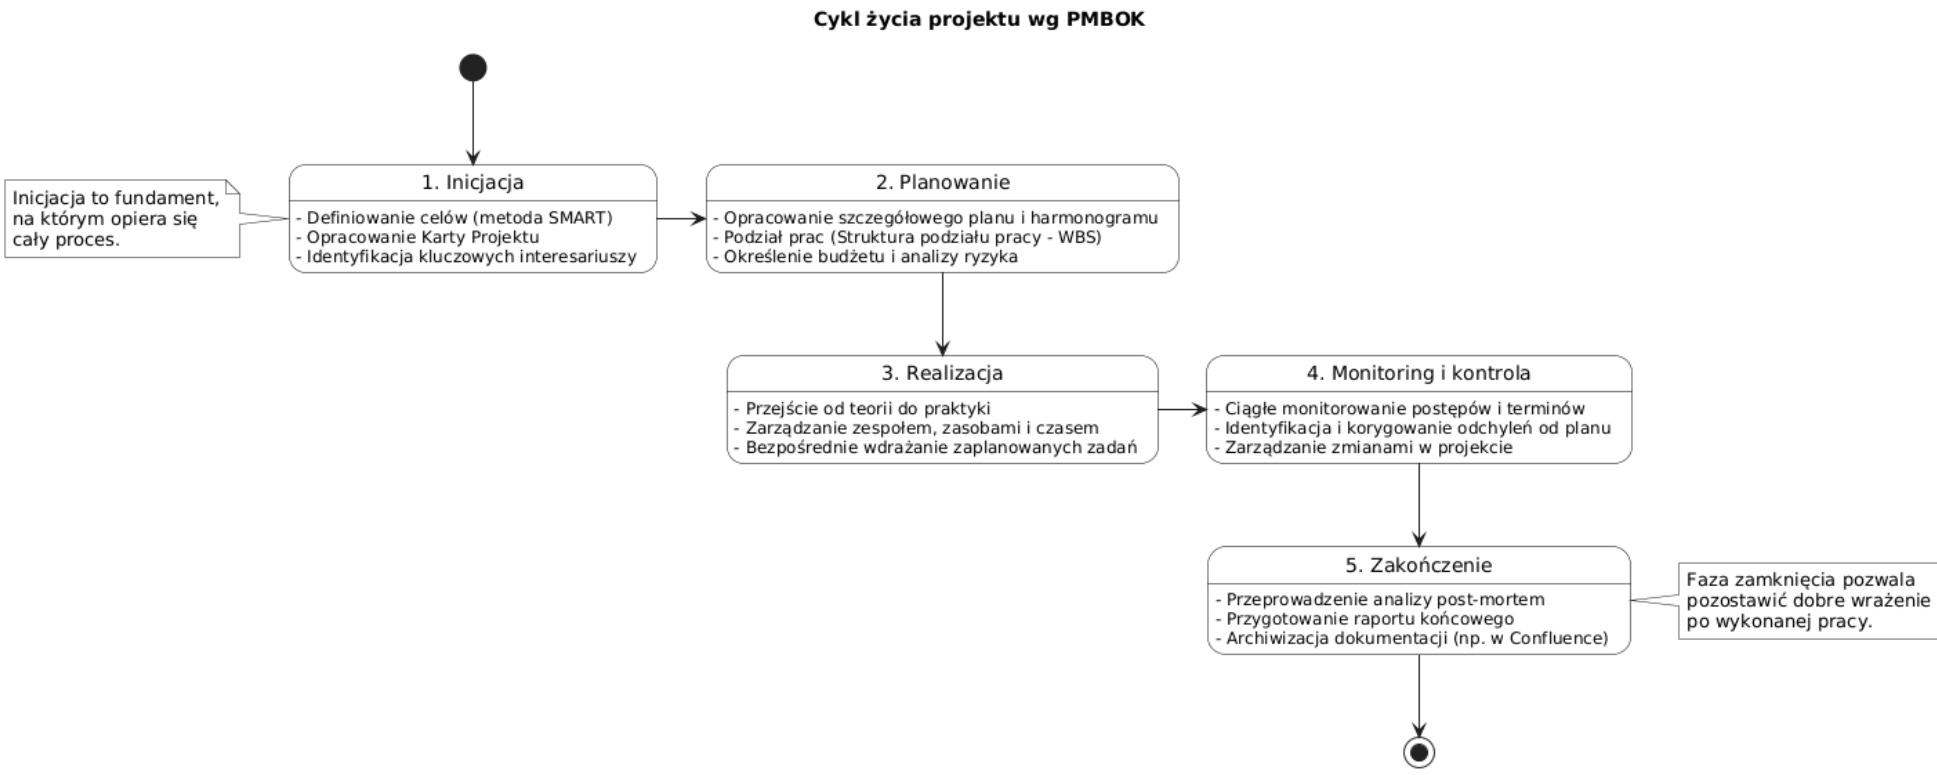

Cykl życia projektu wg PMBOK

- Cykl życia projektu dzieli się na pięć faz: inicjacja, planowanie, wykonanie, monitorowanie i zamknięcie.
- Inicjacja jest pierwszym krokiem i poprzedza szczegółowe planowanie.
- Fazy te mają ustaloną kolejność i muszą być pokonywane zgodnie z tą sekwencją.
- Zrozumienie cyklu życia zapobiega wykonywaniu czynności w przypadkowej kolejności.

3

Kluczowi uczestnicy (Interesariusze)

Kto bierze udział w inicjacji?

- **Sponsor projektu:** Osoba lub organizacja zapewniająca finansowanie; mianuje PM-a i zatwierdza Kartę Projektu.
- **Kierownik projektu (PM):** Odpowiada za zdefiniowanie celów i koordynację uczestników.
- **Zespół projektowy:** Specjaliści (programiści, analitycy) powoływani do realizacji zadań.
- **Interesariusze:** Osoby lub grupy, na które projekt wpływa (np. klienci, użytkownicy, partnerzy).

4

Główne zadania Managera Projektu

Zadania PM na etapie rozpoczęcia

- Jasne zdefiniowanie końcowych celów projektu i korzyści dla biznesu.
- Identyfikacja kluczowych interesariuszy oraz ich wpływu na projekt.
- Określenie granic (zakresu) projektu, co zapobiega zjawisku „scope creep”.
- Wstępna ocena wymaganych zasobów oraz potencjalnych ryzyk.

5

Formułowanie celów metodą **SMART**

Jak formułować cele?

Cele powinny posiadać pięć cech zgodnie z metodą SMART:

- **Specific** (Konkretny) – unikanie ogólnikowych określeń.
- **Measurable** (Mierzalny) – określenie wymiernych wskaźników realizacji.
- **Achievable** (Osiągalny) – ambitny, ale możliwy do zrealizowania.
- **Relevant** (Adekwatny) – powiązany z potrzebą biznesową firmy.
- **Time-bound** (Określony w czasie) – posiadający konkretny horyzont czasowy.

6

Przykład projektu

Przykład: Aplikacja do rezerwacji wizyt lekarskich

- Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej pacjentom szybkie umawianie wizyt lekarskich.
- Użytkownik może przeglądać dostępnych lekarzy oraz wolne terminy wizyt.
- Aplikacja umożliwia rezerwację wizyty oraz otrzymywanie przypomnień o terminie.
- System ma usprawnić organizację pracy przychodni i skrócić czas oczekiwania pacjentów.

Cel projektu w metodzie SMART

- **Specific:** stworzenie aplikacji mobilnej do rezerwacji wizyt lekarskich.
- **Measurable:** co najmniej 500 aktywnych użytkowników w pierwszym miesiącu działania.
- **Achievable:** projekt realizowany przez zespół 4 programistów.
- **Relevant:** usprawnienie procesu rejestracji pacjentów w przychodni.
- **Time-bound:** wdrożenie aplikacji w ciągu 6 miesięcy.

7

Dokumentacja: Karta Projektu

Rola i zawartość Karty Projektu

- Karta Projektu formalizuje rozpoczęcie prac i mianowanie kierownika projektu.
- **Kluczowe elementy:** nazwa, dane PM-a i sponsora, cel, uzasadnienie biznesowe oraz rezultaty.
- Zawiera także ogólny harmonogram kamieni milowych i wstępny budżet.
- Wskazuje na główne założenia, ograniczenia technologiczne oraz ryzyka.
- Informacje w karcie są precyzowane wraz z postępem prac nad projektem.

8

Wyzwania i błędy

Co może pójść nie tak podczas inicjacji?

- Niejasne lub nierealistyczne cele prowadzą do trudności w dalszym planowaniu.
- Niewystarczające zaangażowanie interesariuszy skutkuje brakiem wsparcia dla projektu.
- Niedocenianie potrzebnych zasobów i czasu wywołuje problemy na późniejszych etapach.
- Ignorowanie ryzyka na starcie skutkuje „nieprzyjemnymi niespodziankami” w przyszłości.

9

Podsumowanie

Wpływ inicjacji na dalszą pracę

- Dobrze przeprowadzona inicjacja ułatwia komunikację i przydzielanie ról.

Wpływ inicjacji na dalszą pracę

- Dobrze przeprowadzona inicjacja ułatwia komunikację i przydzielanie ról.
- Pozwala opracować skuteczną strategię zarządzania ryzykiem od samego początku.

Wpływ inicjacji na dalszą pracę

- Dobrze przeprowadzona inicjacja ułatwia komunikację i przydzielanie ról.
- Pozwala opracować skuteczną strategię zarządzania ryzykiem od samego początku.
- Określa kryteria sukcesu, według których projekt będzie mierzony na końcu.

Wpływ inicjacji na dalszą pracę

- Dobrze przeprowadzona inicjacja ułatwia komunikację i przydzielanie ról.
- Pozwala opracować skuteczną strategię zarządzania ryzykiem od samego początku.
- Określa kryteria sukcesu, według których projekt będzie mierzony na końcu.
- Właściwa inicjacja zapewnia jasne zrozumienie celu i zakresu przez cały zespół.

10

Podziękowania

Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do wypełnienia quizu
